


Père Bertrand de BOURRAN  
Evêché BP 7  
419 PORT BERGE  
MADAGASCAR  
bertrandmep@gmail.com

## PHASES DE LA CONSTRUCTION DU DISPENSAIRE A TSARAHASINA (MADAGASCAR) AVRIL - AOUT 2015

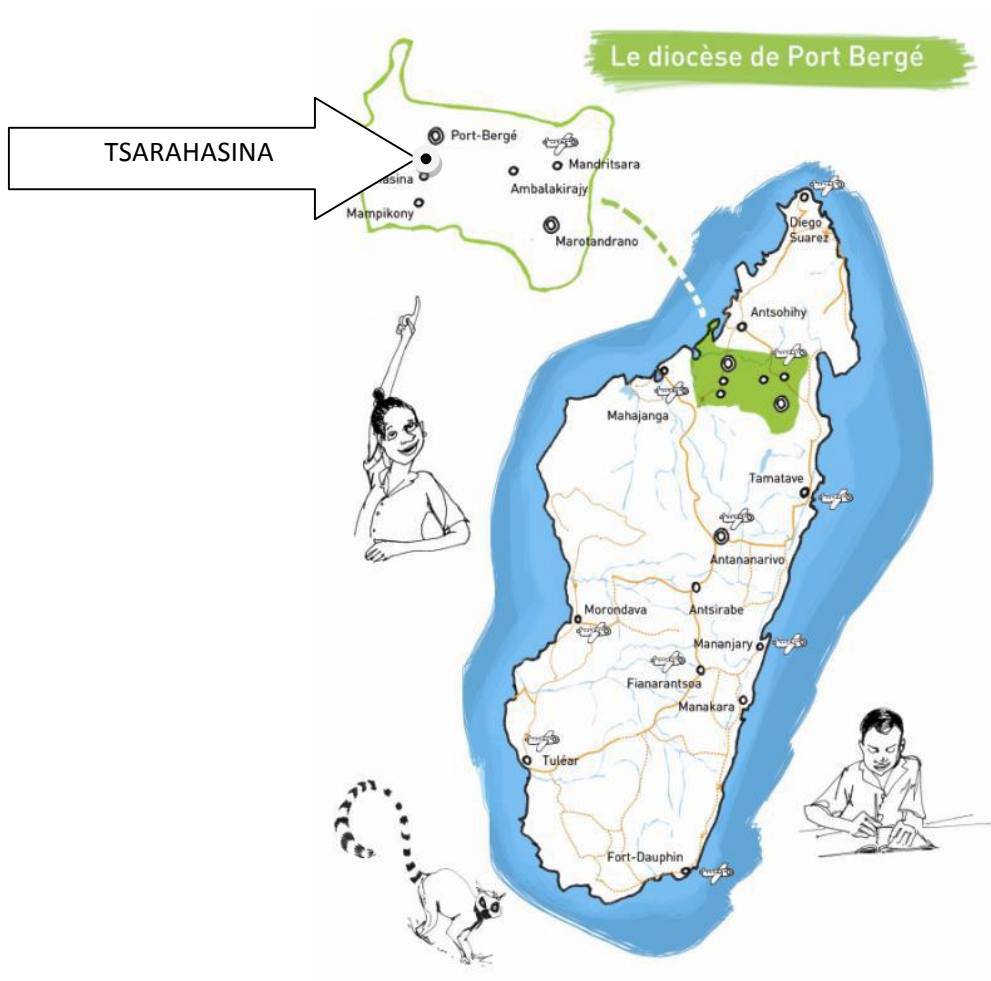

## 1. Les fondations

Pour rappel, les tranchées des fondations furent creusées le 25 avril 2015 par une centaine d'habitants du village, très motivés par le projet.



La construction est assurée par une excellente équipe d'ouvriers pour partie recrutés dans la région, travaillant activement.

Les fondations furent achevées courant mai 2015.

## 2. Les murs



Les cadres des fenêtres furent directement soudés sur place, par Désiré. Les portes et les volets seront également fabriqués sur place par Jean-Pierre à la menuiserie de la mission.





Les briques ont été fabriquées dans la région et sont entreposées sur le site de construction.



Les parpaings sont moulés sur place.



Ici, le chef prépare l'armature en métal des poteaux.





élévation des murs jusqu'à 2,50 m, coulage du chaînage (poutres horizontales), et pose des cadres des fenêtres et des portes.

En résumé :

Juin 2015



Fin juillet 2015





Les murs ont maintenant atteint leur hauteur définitive, le chaînage horizontal (poutres de soutènement de la véranda, en gris), est également terminé.

Les ouvriers sont maintenant en train de crépir les murs intérieurs.



### 3. Le toit

La construction du toit du dispensaire entre dans sa première étape avec l'installation des supports des solives.







Un autre chantier a également commencé : l'équipement du dispensaire. Marie, coopérante, médecin, avec l'aide de collègues radiologues en France, sélectionna un échographe.

Côté médicaments, les choses avancent un petit peu. Un dispensaire proche de la mission a accepté de partager quelques cartons de pansements qui avaient été envoyés de France.

Il y a parfois quelques surprises amusantes dans les fonds de stock :





***Veloma mandra-pihaona !***

*A bientôt !*

Père Bertrand
